Document 2: Plan van aanpak

Naam student: Lore Grymonprez
Naam PXL-coach: Klaas Thys
Naam WPL-coach: Edwin Vanspauwen
Werkplek: Lipa ICT

1 Uitwerking werkstrategie en tijdsplanning

FASE 1: PROBLEEMSTELLING EN ANALYSE	
Activiteit(en): Bekijken hoe de back-ups nu handmatig via de Excel-lijst worden opgevolgd, het probleem van ontbrekende e-mails ('stille uitval') duidelijk omschrijven en afspreken wat er exact wel en niet bij het project hoort. **Doel:** Het probleem helder op papier krijgen en "GO" krijgen om met de graduaatsproef te starten. **Deliverable:** Een goedgekeurd projectvoorstel en een afgewerkt plan van aanpak. **Samenhang en afronding:** Dit was de voorbereidende fase van het project. **Stappen:** > Opschrijven wat er momenteel te veel tijd kost of misgaat bij het controleren van de back-ups. > De doelen van het project bespreken en vastleggen met Lipa ICT. > De CheckCentral-documentatie doornemen en benodigde monitoring-functies bepalen. > Het projectvoorstel en dit plan van aanpak uitschrijven.	**Mijlpaal:** 1 november 2026 (Einde week 6). **Betrokkenen:** PXL-coach (Klaas Thys) en werkplekcoach (Edwin Vanspauwen) **Onderzoeksmethode:** Afwegen, inventariseren, literatuurstudie, observatie

FASE: 2. ONDERZOEKSUITVOERING	
Activiteit(en): Inventariseren van de exacte aantallen back-ups voor de 22 contractklanten (circa 140 checks, verspreid over 12+ systemen waaronder N-able Cove (60), BackupAssist (33), Veeam (12) en AvePoint (11)). **Doel:** De huidige back-upcontrole en de mogelijkheden van CheckCentral onderzoeken. Onderzoeksvraag: welke back-ups, meldingen en functies zijn nodig voor een duidelijk klantoverzicht? **Deliverable:** Documentatie van de huidige back-upsituatie, een aangemaakt Lipa Support-account en een demoverslag. **Samenhang en afronding:** De inventarisatie vormt de basis voor fase 3.1: Design. Back-ups, voorbeeldmeldingen, frequenties en benodigde functies worden vastgelegd en besproken met de werkplekcoach. De aantallen per product worden gecontroleerd vóór de uitrol en prijsinschatting. **Stappen:** > De huidige back-upsituatie en aantallen documenteren (circa 140 checks, verspreid over meer dan 12 systemen). > Een gratis CheckCentral-account voor Lipa Support aanmaken (Free tier). > De CheckCentral-documentatie doornemen en benodigde monitoring-functies bepalen. > Een technische demo aanvragen en bijwonen; gerichte vragen stellen over de implementatie.	**Mijlpaal:** Midden november (geplande afronding: 15 november 2026). **Betrokkenen:** Werkplekcoach (Edwin Vanspauwen), support engineers van Lipa ICT en CheckCentral-support (extern). **Onderzoeksmethode:** Inventarisatie: back-ups en meldingen in kaart brengen. Literatuurstudie: de documentatie van CheckCentral lezen. Interview: de vereisten bespreken met de werkplekcoach en vragen stellen tijdens de demo.

FASE: 3.1 BOUWEN – DESIGN

Activiteit(en): De structuur, mailflow en tijdsvensters voor ontbrekende back-upmeldingen bepalen.

Doel: De klantindeling, mailflow en foutafhandeling vastleggen vóór het aanmaken van checks. Onderzoeksvraag: hoe richten we de groepering, matchingregels en tijdsvensters correct in?

Deliverable: Een beknopt ontwerpdocument met een flowdiagram, naamgevingsconventies en een overzicht van de tijdsvensters.

Samenhang en afronding: Het ontwerp volgt uit de inventarisatie. Het bevat de klantindeling, naamgeving, mailflow, matchingregels en tijdsvensters. De werkplekcoach beoordeelt het ontwerp vóór de uitrol. Onduidelijke meldingen worden onderzocht en instellingen waar nodig aangepast.

Stappen:

> De mailflow en mogelijke integraties uitwerken voor N-able Cove en de overige back-uptools.
> Naamgeving en groepering per contractklant afspreken.
> Per back-uptype tijdsvensters bepalen voor de detectie van ontbrekende meldingen (Missing).
> Het ontwerp met de werkplekcoach bespreken en feedback verwerken.

Mijlpaal: 29 november 2026: het ontwerp is besproken en gereed voor implementatie. Verslag check-in 4 wordt op dezelfde datum ingediend.

Betrokkenen: Werkplekcoach (Edwin Vanspauwen).

Onderzoeksmethode: Vergelijking: meldingen en backupschema's vergelijken om de indeling, matchingregels en tijdsvensters te bepalen.

FASE: 3.2 BOUWEN – IMPLEMENTATIE

Activiteit(en): CheckCentral stapsgewijs inrichten en de back-ups koppelen.

Doel: Alle actieve back-ups van contractklanten overzichtelijk monitoren. Het dashboard toont minimaal Success, Error, Warning en Uncategorized per klant. Ontbrekende e-mails worden ook gedetecteerd. Support moet snel zien welke back-up onderzoek vraagt. Onderzoeksvraag: hoe brengen we de meldingen samen in één klantoverzicht?

Deliverable: Een werkend CheckCentral-dashboard met gekoppelde checks, ingestelde tijdsvensters en een overzicht per klant van Success, Error, Warning en Uncategorized.

Samenhang en afronding: De uitrol volgt het beoordeelde ontwerp. Elke groep checks wordt meteen getest in fase 3.3. Configuratiekeuzes worden vastgelegd voor de handleiding. Autotask wordt alleen gekoppeld als dashboard, testen en overdracht klaar zijn en er tijd overblijft.

Stappen:

> De Enterprise-proefperiode van 60 dagen activeren en start- en einddatum vastleggen. De prijsbeoordeling en abonnementskeuze vóór afloop plannen.
> Stap 1 — N-able Cove: 60 checks toevoegen en configureren.
> Stap 2 — De overige back-ups toevoegen en de benodigde matchingregels instellen: BackupAssist (33), Veeam (12), AvePoint (11), Iperius (8), Synology (6), Acronis (4) en Nakivo (2).
> Stap 3 — Per check het verwachte tijdsvenster instellen om ontbrekende e-mails te signaleren.
> Stap 4 — Indien tijd overblijft: Autotask koppelen voor automatische ticketcreatie.

Mijlpaal: Eind december (N-able Cove gereed begin december; overige back-ups via e-mail gereed vóór de kerstvakantie, zodat de volledige parallelle monitoring vanaf 21 december 2026 kan starten).

Betrokkenen: Werkplekcoach (Edwin Vanspauwen) en support engineers van Lipa ICT.

Onderzoeksmethode: Observatie: controleren hoe CheckCentral de binnenkomende meldingen verwerkt en afwijkingen noteren.

FASE: 3.3 BOUWEN – TESTEN

Activiteit(en): Controleren of de checks en de detectie van ontbrekende e-mails werken.
Doel: Controleren of statussen en klantgroepering correct zijn. Ongecategoriseerde en ontbrekende meldingen moeten zichtbaar blijven. Onderzoeksvraag: geeft het dashboard support een correct en duidelijk klantoverzicht?
Deliverable: Een testrapport en definitieve instellingen. Minimale vereisten: Success, Error, Warning en Uncategorized zijn zichtbaar. Meldingen staan bij de juiste klant en categorie. Een supportcollega kan een back-upfout terugvinden. Ontbrekende meldingen worden na het tijdsvenster gesignaleerd.
Samenhang en afronding: De tests volgen het ontwerp en de dashboardvereisten. Verwachte en werkelijke resultaten worden vastgelegd. Bij fouten worden ontwerp of instellingen aangepast en opnieuw getest. De werkplekcoach beoordeelt het resultaat vóór overdracht. Resterende beperkingen worden genoteerd.
Stappen:

> Success, Warning, Error en Uncategorized testen en de klantgroepering controleren.
> Controleren of een alarm volgt wanneer een verwachte e-mail niet op tijd aankomt.
> Een supportcollega het klantoverzicht laten testen en de feedback vastleggen.
> Elke ingestelde groep checks meteen testen. Vanaf 21 december 2026 minstens twee weken naast de huidige controle monitoren, inclusief wekelijkse back-ups.
> Matchingregels en tijdsvensters bijsturen. Van 4–10 januari 2027 buffer voorzien voor hertests en deze afstemmen met overdracht en prijsadvies.

Mijlpaal: Begin januari (uiterlijk 10 januari 2027).

Betrokkenen: Support engineers van Lipa ICT, werkplekcoach (Edwin Vanspauwen) en PXL-coach (Klaas Thys).

Onderzoeksmethode: Observatie: met testmeldingen controleren of de statussen, het klantoverzicht en ontbrekende meldingen correct worden weergegeven. Vergelijking: de resultaten vergelijken met de huidige controle.

FASE: 3.4 BOUWEN – DOCUMENTATIE EN MAINTENANCE

Activiteit(en): Een beheerhandleiding opstellen, de oplossing overdragen en licentieadvies formuleren.
Doel: Support kan het dashboard zelfstandig gebruiken en onderhouden. Alleen support krijgt beheerdersrechten. Het prijsadvies ondersteunt de abonnementskeuze. Onderzoeksvraag: welke handleiding en welk abonnement zijn nodig na de proefperiode?
Deliverable: Een beheerhandleiding, overdracht en prijsinschatting met abonnementsvoorstel. Het prijsdocument bevat het aantal checks, de buffer, kosten en voorwaarden. Een offerte of bevestiging wordt toegevoegd indien beschikbaar. Een contract of factuur volgt alleen bij afsluiting van het abonnement.
Samenhang en afronding: De handleiding wordt tijdens de implementatie geschreven en na de tests bijgewerkt. Een supportcollega test de beheertaken. Feedback wordt verwerkt en de werkplekcoach beoordeelt het prijsvoorstel. De abonnementskeuze gebeurt vóór afloop van de proefperiode. Aankoop is geen voorwaarde voor het prijsadvies.
Stappen:

> Een handleiding schrijven voor dashboardgebruik en het toevoegen van back-ups en matchingregels.
> Een supportcollega de handleiding laten testen en feedback verwerken.
> Het supportteam een korte uitleg en demo geven.
> Een prijsinschatting met buffer maken op basis van het definitieve aantal checks. De actuele prijs en abonnementsvoorwaarden worden vóór afloop van de proefperiode gecontroleerd en besproken. ($70 per maand voor 140 checks; $140 met buffer).
> Overdracht en prijsvoorstel met de werkplekcoach beoordelen en beslissingen vastleggen.

Mijlpaal: 10 januari 2027 (oplevering van het werkplekresultaat).

Betrokkenen: Support engineers van Lipa ICT en werkplekcoach (Edwin Vanspauwen).


Onderzoeksmethode: Observatie: een collega de handleiding laten gebruiken. Interview: vragen wat duidelijk is en wat beter kan. Vergelijking: prijzen en abonnementsvoorwaarden vergelijken.

FASE: 4. RAPPORTEREN & FASE: 5. REFLECTEREN	
Activiteit(en): Het eindrapport en de persoonlijke reflectie schrijven en de jurypresentatie voorbereiden. **Doel:** Bevindingen, keuzes en resultaten bundelen voor PXL. Centrale onderzoeksvraag: hoe biedt CheckCentral support een duidelijk klantoverzicht voor back-upopvolging? De reflectie beschrijft het projectverloop en de geleerde lessen. **Deliverable:** Een ingediend eindrapport, een reflectieverslag en presentatieslides met een demo. **Samenhang en afronding:** Het rapport wordt vanaf de onderzoeksfase opgebouwd. Conclusies volgen uit test- en overdrachtsresultaten. Beide coaches lezen het concept na. Daarna worden rapport en reflectie afgerond en de presentatie en demo geoefend. **Stappen:** > Het eindrapport schrijven met probleemstelling, aanpak, keuzes, testresultaten en conclusie. > Beide coaches het conceptrapport laten nalezen, inclusief de anonimisering van klantnamen. > De persoonlijke reflectie schrijven over het projectverloop en verbeterpunten. > Presentatieslides maken en de jurydemo voorbereiden. > Presentatie en demo oefenen, feedback verwerken en de resultaten koppelen aan de onderzoeksvraag.	**Mijlpaal:** 17 januari 2027: eindrapport ingediend. Presentatie en juryverdediging: examenperiode januari 2027; exacte datum via Blackboard. **Betrokkenen:** PXL-coach (Klaas Thys), werkplekcoach (Edwin Vanspauwen) en jury. **Onderzoeksmethode:** Inventarisatie: bevindingen en resultaten verzamelen voor het rapport. Vergelijking: de resultaten vergelijken met de doelen en de oorspronkelijke planning.

2 Visuele voorstelling planning

Checkcentral Backup Dashboard - Gantt chart

Task	Start	End
Fase 1 - Probleemstelling, analyse en plan v…	2026-09-21	2026-11-01
Verslag check-in 1	2026-10-04	2026-10-04
Projectvoorstel	2026-10-11	2026-10-11
Verslag check-in 2	2026-10-25	2026-10-25
Plan van aanpak	2026-11-01	2026-11-01
Buffer/iteratie - herwerking na feedback of no…	2026-10-12	2026-10-25
Fase 2 - Onderzoek en inventarisatie	2026-11-02	2026-11-15
Feedbackmoment - check-in 3	2026-11-15	2026-11-15
Fase 3.1 - Design	2026-11-16	2026-11-29
Feedbackmoment - ontwerpcheck en check-i…	2026-11-23	2026-11-29
Fase 3.2 - Implementatie	2026-11-30	2026-12-20
Feedbackmoment - check-in 5	2026-12-13	2026-12-13
Fase 3.3 - Testen, schaduwdraaien en itereren	2026-12-14	2027-01-10
Buffer/risico - technische bijsturing en…	2026-12-19	2027-01-10
Fase 3.4 - Documentatie, overdracht en…	2026-12-14	2027-01-10
Mijlpaal - gerealiseerd resultaat	2027-01-10	2027-01-10
Fase 4 en 5 - Rapporteren en reflecteren	2026-11-16	2027-01-17
Feedback/iteratie - conceptrapport nalezen	2027-01-04	2027-01-17
Mijlpaal - eindrapport en reflectie	2027-01-17	2027-01-17
Fase 5 - Presentatie, demo en…	2027-01-18	2027-01-31
Mijlpaal - Juryverdediging - exacte datum te…	2027-01-31	2027-01-31
Optioneel - Autotask-koppeling	2026-12-28	2027-01-10

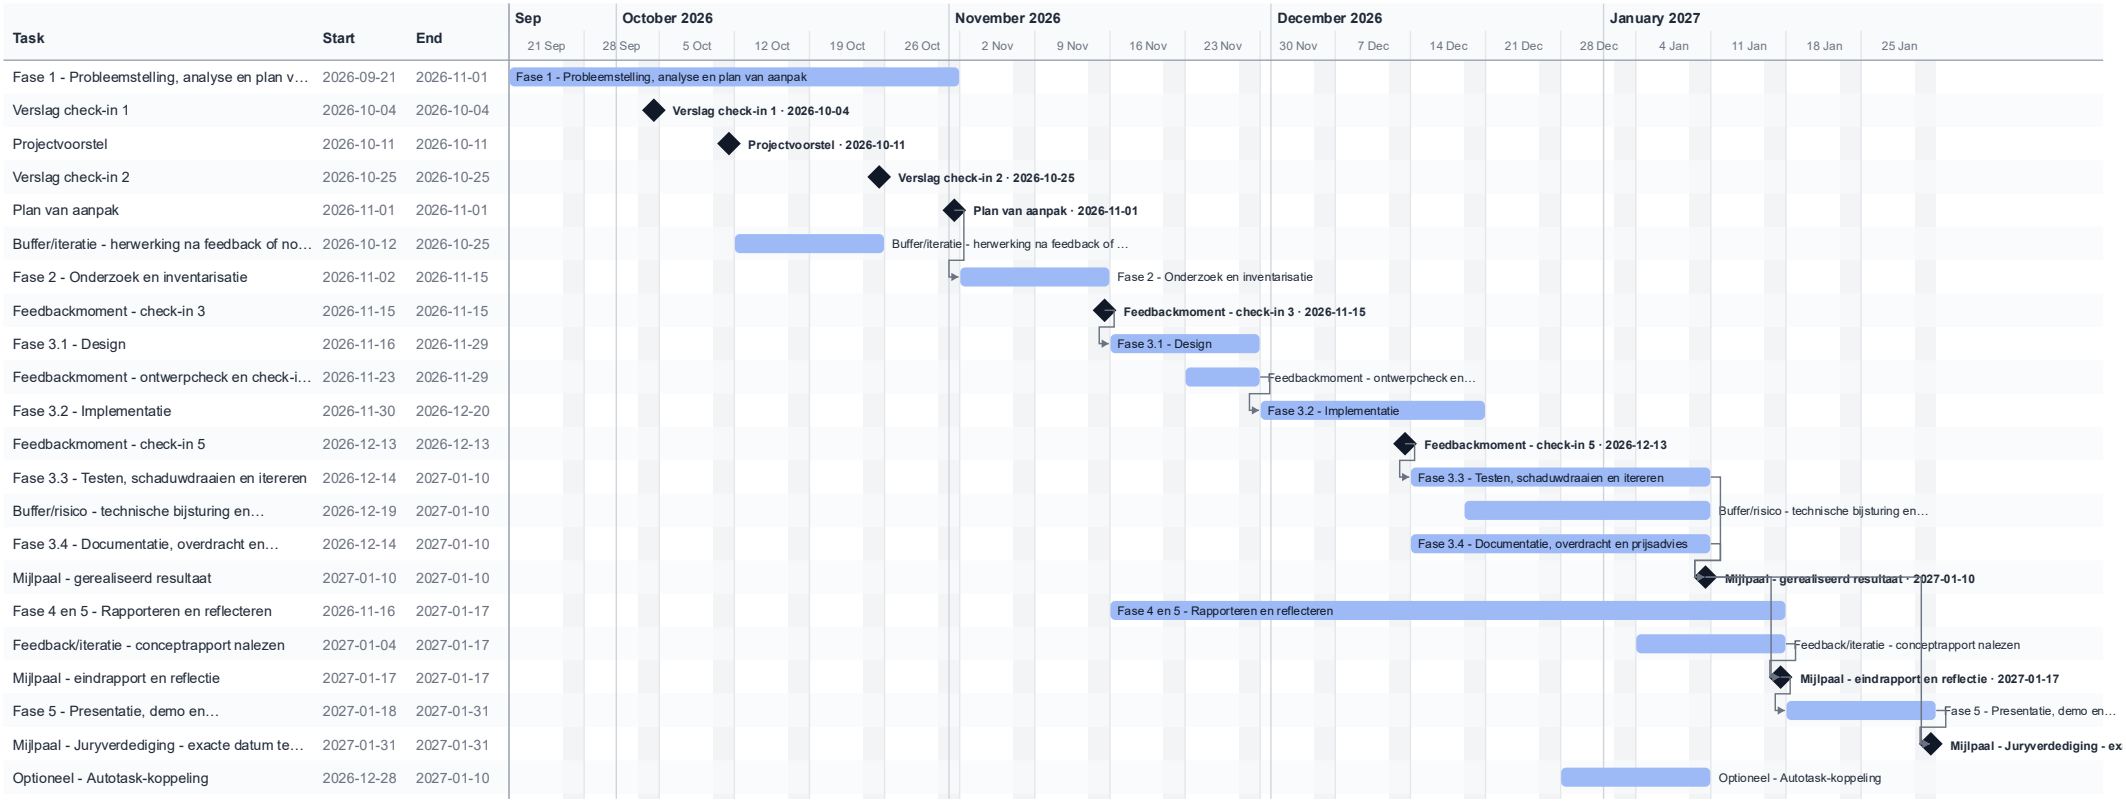

Figuur 1 Gantt-chart van de graduaatsproef: implementatie van CheckCentral voor back-upmonitoring.

3 Goedkeuring werkplek

4 Voorstel van titel

CheckCentral-back-updashboard
